

Baustellenstammtisch 22.02.2018 Deponie Stäffelesrain





Maßnahmenstand

- > Stilllegung und Ausbau Deponie Stäffelesrain
 - Ausnahmeantrag Natur
 - Vorabzug fertig (Büro Trautner)
 - Immissionsgutachten
 - > Fertiggestellt (Büro IMA)
 - > LBP
 - Wird im Lauf der Woche erwartet
 - Genehmigungsantrag
 - > Abgabe Osten 2018
 - > Erwartete Genehmigung Spätsommer 2018
 - > Bau
 - > Ab 2019
 - Maßnahme vorgezogene Entgasung
 - Abgeschlossen



Maßnahmenstand

Wertstoffhof

- Genehmigung liegt vor
- Ausschreibung vorraussichtlich im März

> Grünschnittplatz

- Genehmigung liegt vor
- Ausschreibung voraussichtlich im März

Einfahrtsbereich

- ➤ Konkretere Konzepte liegen vor, Endabstimmung steht aus
- > Zusätzliche Einfahrtsspur
- > Getrennte Spuren für Wertstoffhof / Grüngutplatz und Deponie / LKW

> Sickerwasservorbehandlung

Baubeginn im März

Vorflutkanal


- Genehmigung liegt vor
- > Bauausschreibung März
- Ausführung ab April / Mai




Sickerwasservorbehandlung




- Aufbau und Betrieb durch Fa. TDL
- Bereits angeliefert:2 Aktivkohlebehälter
- Aufbau der Anlage: ab März

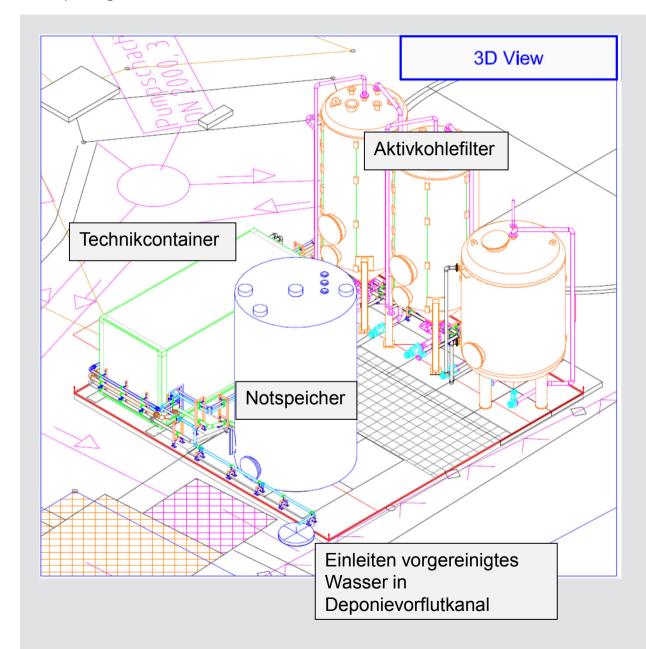



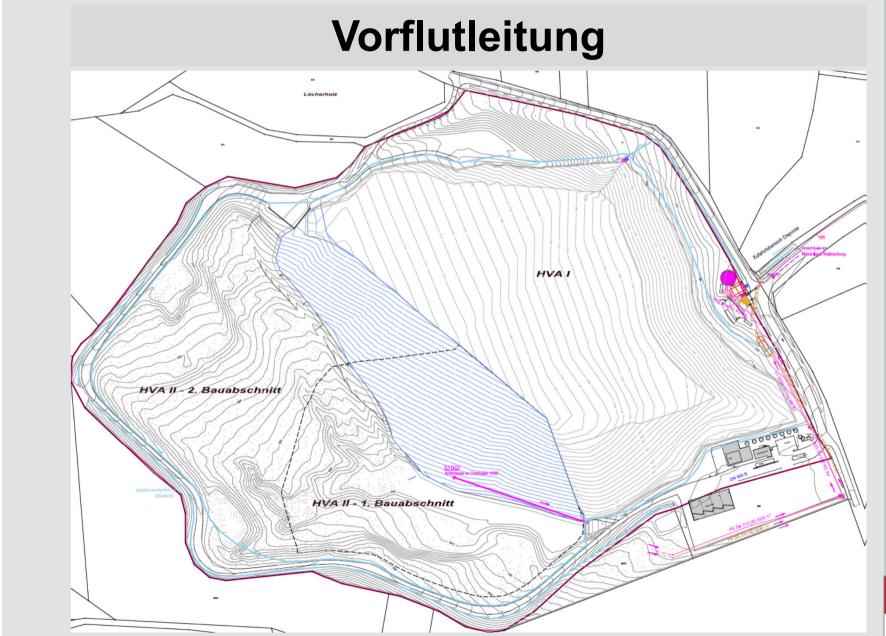



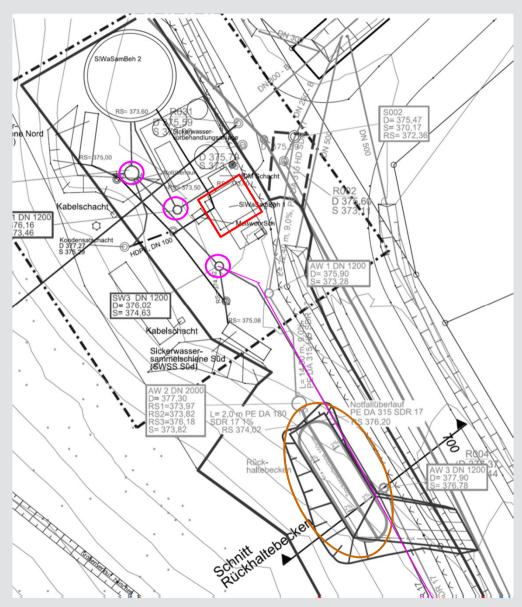

- Ersetzen der Betonschächte durch HDPE-Schächte
- Bau eines Rückhaltebeckens für Abwasser
- > Stilllegung altes Speicherbecken
- ➤ Eigener Anschluss HVA I-3 (statt Leitung durch HVA I-2)



Ende

